

DIOCESI DI CARPI



**ORDINANZA 111/2013 e s.m.i.
PROGETTO ESECUTIVO INERENTE IL RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA CHIESA CAMPANILE E CANONICA DELLA CONVERSIONE DI S. PAOLO
APOSTOLO, CODICE INTERVENTO ID 2450**

SPAZIO PER TIMBRI AUTORIZZATIVI:

ELABORATO:

D5rev2

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

(art.40 D.P.R. 5/10/2010 n. 207)
MODIFICATO IN SEGUITO A RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI
CONGRUITA' DELLA SPESA

Data:
15/11/2018

La proprietà:
Parrocchia di S. Paolo apostolo
via Budrione Migliarina, 42-44
41012 Comune di Carpi, località Budrione (MO)

Ente Attuatore:
DIOCESI DI CARPI
Corso Fanti, 13
41012 Carpi (MO)

Progetto Architettonico:
Arch. Gian Lorenzo Ingrami (n°417/MO)

Arch. Mauro Pifferi (n°692/MO)

STUDIO SULLA VIA DELLA PACE
via del Pretorio, 57
41049 Sassuolo (MO)


Progetto strutturale:
Ing. Giovanni Gualerzi (n°1623/PR)

Collaboratore:
Ing. Alessandro Gianni

IDEA Studio Associato
Strada Quingenti, 68
43123 San Prospero di Parma

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Marco Soglia

Table with columns for item number, description, date, quantity, and months (Mese 1 to Mese 28). The table contains a list of construction tasks such as 'PIASTRE METALLICHE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI' and 'INTONACO CIVILE A BASE DI CALCE NATURALE'. It includes a Gantt chart visualization with blue bars indicating task durations across the 28-month period.

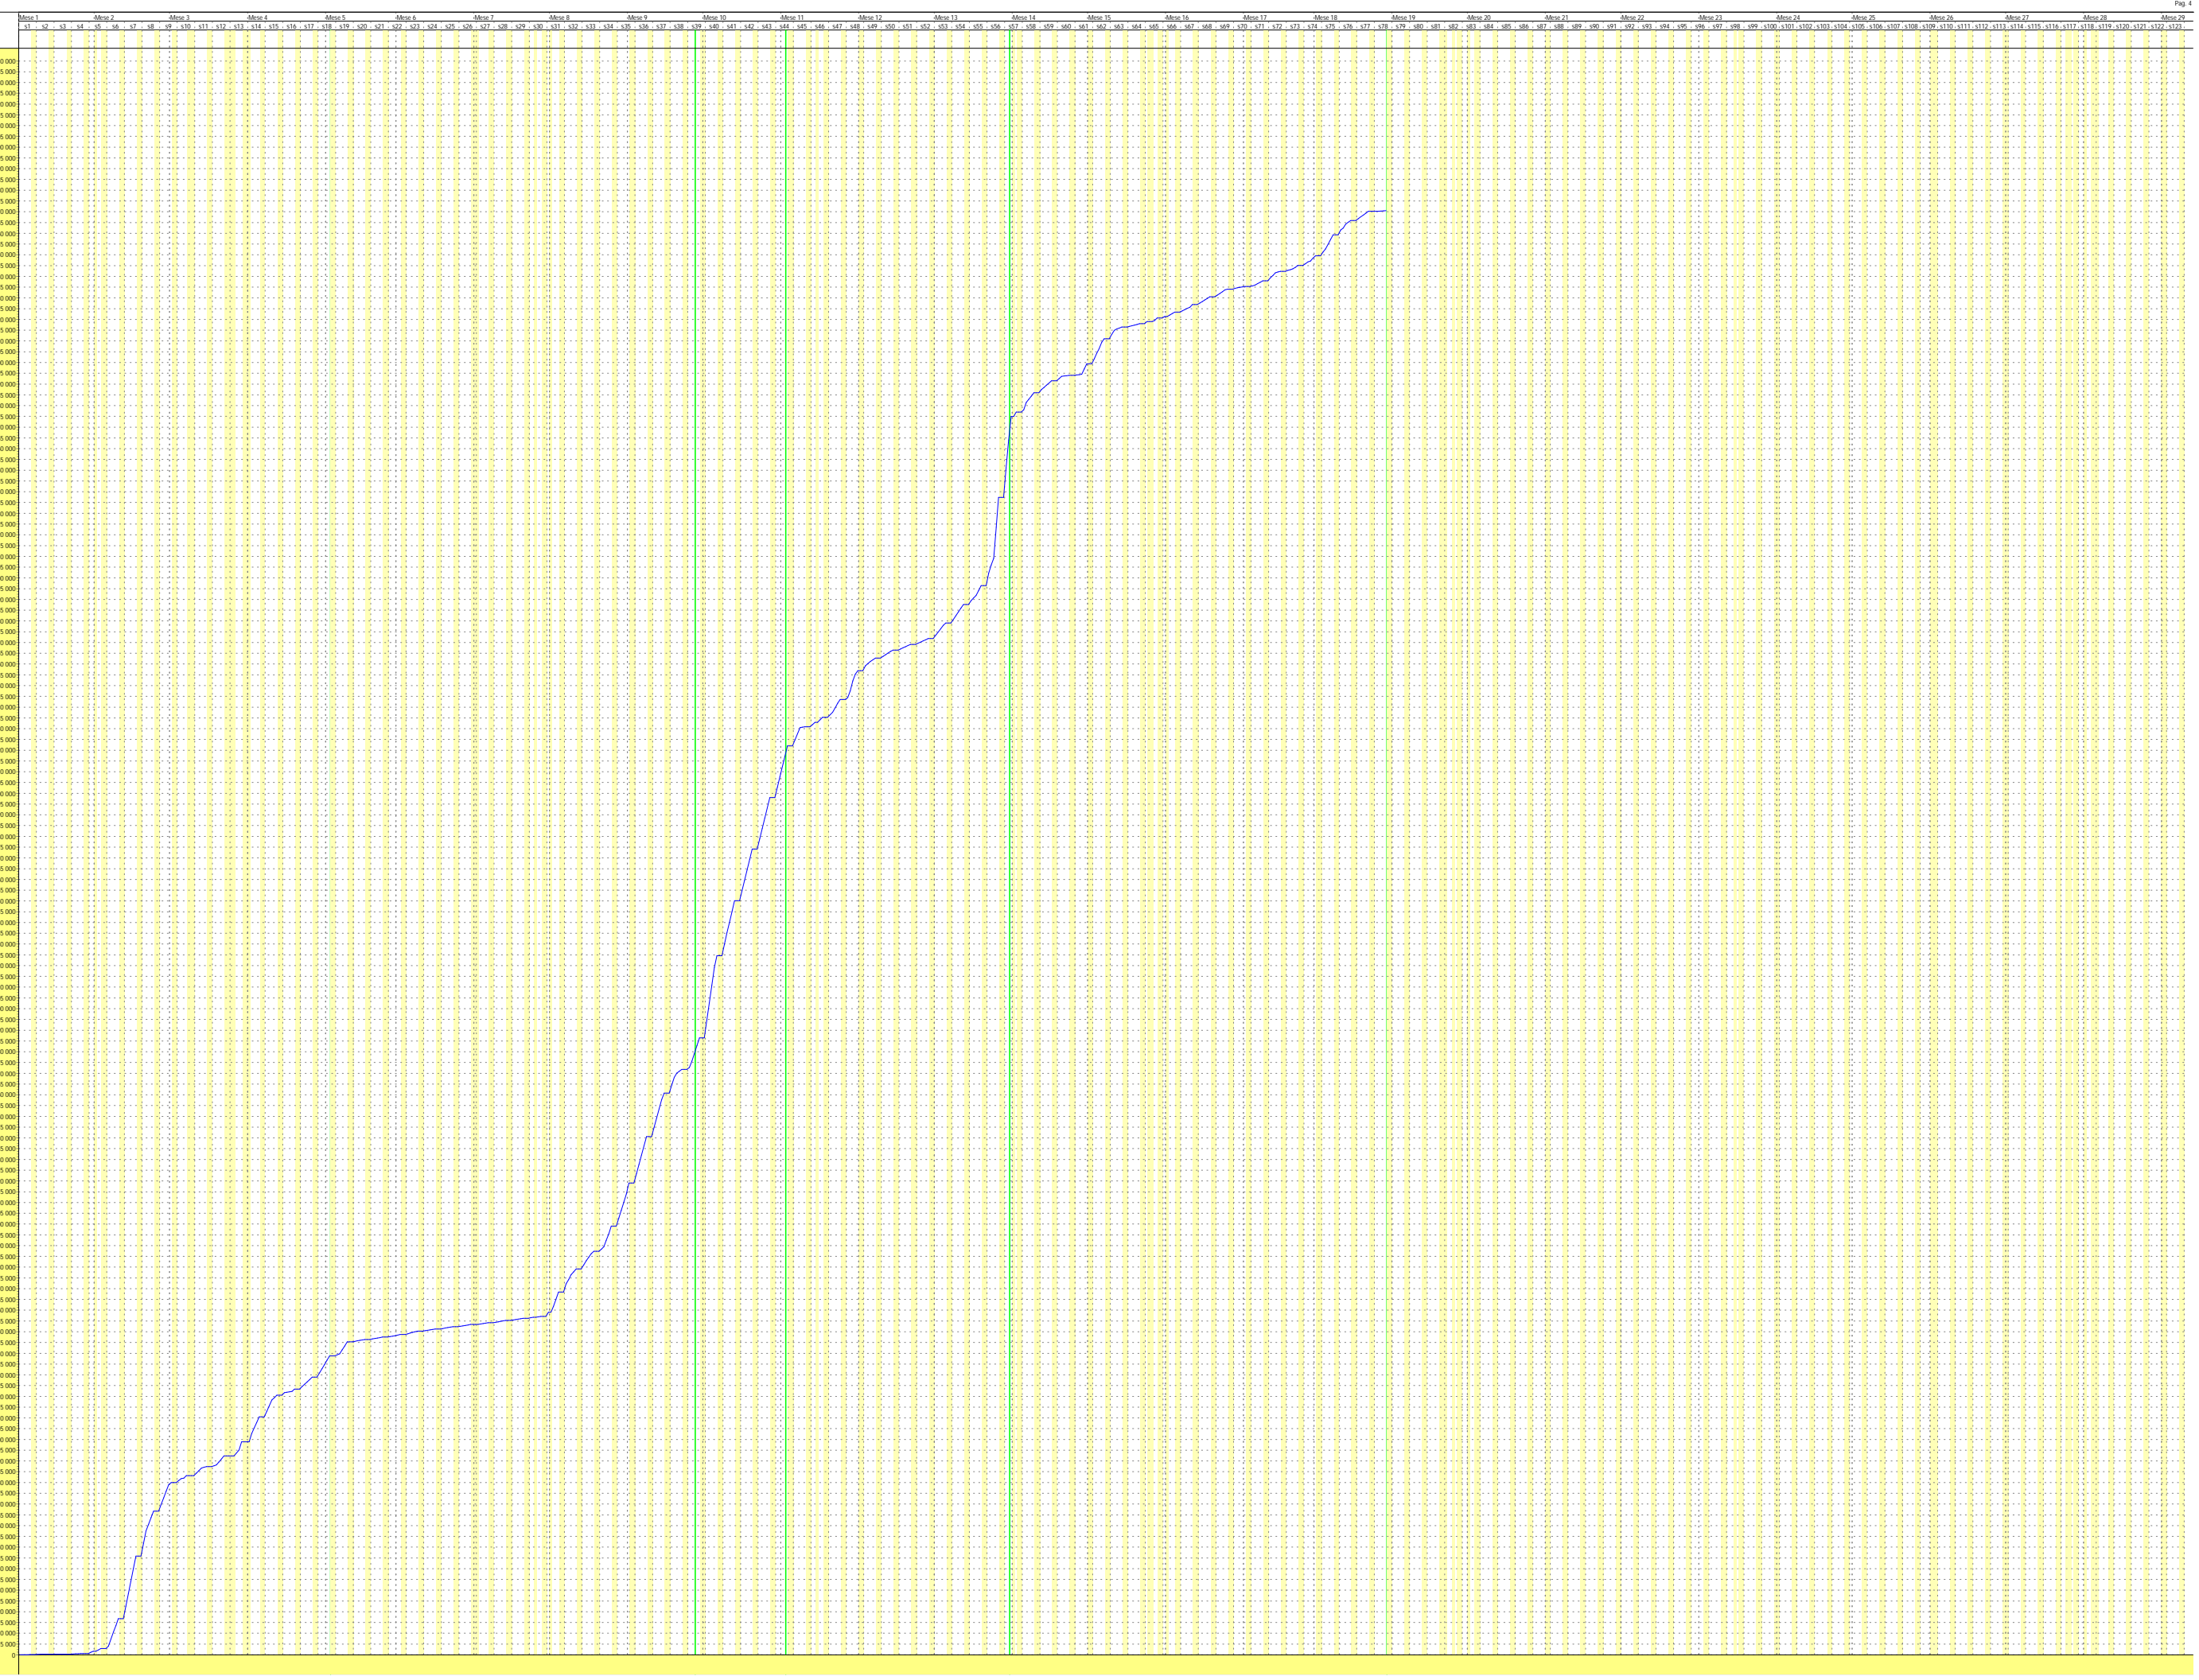

— Prestazioni
— SAL

Carpi

Parrocchia della Conversione di San Paolo Apostolo in Budrione di Carpi

Tabella Attività

OGGETTO: Ripristino dell'agibilità della Chiesa e della Canonica della parrocchia della Conversione di S. Paolo Apostolo in Budrione di Carpi

COMMITTENTE: Diocesi di Carpi

Carpi, 20/04/2018

Il Tecnico
(per lo Studio Sulla Via della Pace)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	670'467,78	100,000	1 gg	544 gg	377	544
* ONERI SICUREZZA, PONTEGGI E PUNTELLAZIONI	141'914,14	21,166	1 gg	544 gg	377	544
* * SEGNALAZIONE CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI LATO 60cm.	145,44	0,022	1 gg	544 gg	377	544
* * PALO ZINCATO ANTIROTAZIONE PER POSA SEGNALI STRADALI - H 2,0m.	66,24	0,010	1 gg	544 gg	377	544
* * BASE MOBILE PER PALI - COSTO MENSILE.	80,64	0,012	1 gg	544 gg	377	544
* * BASE MOBILE PER PALI - POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE.	7,76	0,001	1 gg	544 gg	3	3
	<i>5,17</i>	<i>0,001</i>	<i>1 gg</i>	<i>2 gg</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>2,59</i>	<i>0,000</i>	<i>544 gg</i>	<i>544 gg</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
* * DISPOSITIVO LUMINOSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE NELLE ORE NOTTURNE - COSTO MENSILE.	771,12	0,115	1 gg	544 gg	377	544
* * DISPOSITIVO LUMINOSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE NELLE ORE NOTTURNE - INSTALLAZIONE E RIMOZIONE.	29,48	0,004	2 gg	544 gg	3	3
	<i>19,68</i>	<i>0,003</i>	<i>2 gg</i>	<i>3 gg</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>9,80</i>	<i>0,001</i>	<i>544 gg</i>	<i>544 gg</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
* * PONTEGGI A TELAIO - MISURA FACCIATA - MONTAGGIO E UTILIZZO PRIMI 30gg.	29'113,86	4,342	32 gg	243 gg	44	60
	<i>11'620,52</i>	<i>1,733</i>	<i>32 gg</i>	<i>60 gg</i>	<i>21</i>	<i>29</i>
	<i>17'493,34</i>	<i>2,609</i>	<i>213 gg</i>	<i>243 gg</i>	<i>23</i>	<i>31</i>
* * PONTEGGI A TELAIO - MISURA FACCIATA - UTILIZZO E MANTENIMENTO IN FUNZIONE NEI MESI SUCCESSIVI AL PRIMO.	26'470,53	3,948	61 gg	516 gg	314	456
* * PONTEGGI A TELAIO - MISURA FACCIATA - SMONTAGGIO ED ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE.	10'461,63	1,560	519 gg	537 gg	15	19
* * PONTEGGIO CON SISTEMA TUBO-GIUNTO - MEDIA DIFFICOLTA' - MONTAGGIO E UTILIZZO PRIMI 30gg.	1'768,80	0,264	33 gg	60 gg	20	28
* * PONTEGGIO CON SISTEMA TUBO-GIUNTO - MEDIA DIFFICOLTA' - UTILIZZO E MANTENIMENTO IN FUNZIONE MESI SUCCESSIVI AL PRIMO.	673,20	0,100	61 gg	150 gg	60	90
* * SMONTAGGIO PONTEGGIO TUBO-GIUNTO.	620,40	0,093	151 gg	159 gg	7	9
* * PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI - MISURA AREA PIANO DI LAVORO - MONTAGGIO SMONTAGGIO E UTILIZZO PRIMI 30gg.	8'401,33	1,253	36 gg	537 gg	66	86
	<i>2'204,24</i>	<i>0,329</i>	<i>36 gg</i>	<i>60 gg</i>	<i>19</i>	<i>25</i>
	<i>1'868,00</i>	<i>0,279</i>	<i>213 gg</i>	<i>243 gg</i>	<i>23</i>	<i>31</i>
	<i>2'148,20</i>	<i>0,320</i>	<i>337 gg</i>	<i>347 gg</i>	<i>9</i>	<i>11</i>
	<i>2'180,89</i>	<i>0,325</i>	<i>519 gg</i>	<i>537 gg</i>	<i>15</i>	<i>19</i>
* * PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI - MISURA AREA PIANO DI LAVORO - USO E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA NEI MESI SUCC. AL PRIMO.	23'701,05	3,535	61 gg	516 gg	314	456
* * TRABATTELLO PREFABBRICATO IN TUBOLARE METALLICO - H DA 3,6m A 5,4m - COSTO MENSILE.	1'032,70	0,154	123 gg	271 gg	104	149
* * CASSEFORME RETTE O CENTINATE PER PUNTELLAZIONI A TUTTA SUPERFICIE DELLE VOLTE E DELLE CUPOLE.	19'267,60	2,874	43 gg	51 gg	7	9
* * TETTOIE DI PROTEZIONE - MISURATO SUPERFICIE - MONTAGGIO USO PER UN ANNO SMONTAGGIO - TAVOLE LEGNO SP 5cm.	1'532,16	0,229	32 gg	365 gg	230	334
* * STRUTTURA DI SOSTEGNO METALLICA PER TETTOIE DI PROTEZIONE - MONTAGGIO/SMONTAGGIO.	1'259,52	0,188	32 gg	365 gg	230	334
* * STRUTTURA DI SOSTEGNO METALLICA PER TETTOIE DI PROTEZIONE - UTILIZZO UN ANNO.	1'632,00	0,243	32 gg	365 gg	230	334
* * TESSUTO NON TESSUTO IN POLIESTERE.	350,40	0,052	22 gg	30 gg	7	9
* * PUNTELLO METALLICO REGOLABILE - H FINO A 3,6m DAL PIANO DI APPOGGIO - COSTO MENSILE.	2'490,00	0,371	43 gg	339 gg	205	297
* * PUNTELLO METALLICO REGOLABILE - H FINO A 3,6m DAL PIANO DI APPOGGIO - MONTAGGIO/SMONTAGGIO.	1'614,00	0,241	36 gg	339 gg	6	6

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI		
	euro	(%)			Lav.	Tot.	
	** periodo 01	807,00	0,120	36 gg	38 gg	3	3
	** periodo 02	807,00	0,120	337 gg	339 gg	3	3
* * RECINZIONE DI CANTIERE MONTAGGIO E SMONTAGGIO.		65,14	0,010	5 gg	544 gg	6	8
	** periodo 01	32,57	0,005	5 gg	9 gg	3	5
	** periodo 02	32,57	0,005	542 gg	544 gg	3	3
* * RECINZIONE DI CANTIERE COSTO UTILIZZO MENSILE.		329,14	0,049	8 gg	544 gg	372	537
* * RECINZIONE DI CANTIERE IN POLIETILELENE AD ALTA DENSITA'. H 200cm COSTO DI UTILIZZO PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE.		372,00	0,055	5 gg	544 gg	6	8
	** periodo 01	186,00	0,028	5 gg	9 gg	3	5
	** periodo 02	186,00	0,028	542 gg	544 gg	3	3
* * RECINZIONE DI CANTIERE IN POLIETILELENE AD ALTA DENSITA'. H 200cm ALLESTIMENTO E RIMOZIONE.		1'158,00	0,173	8 gg	544 gg	372	537
* * DISPOSITIVO ANTICADUTA LINEA DI VITA.		8'500,00	1,268	211 gg	218 gg	5	8
* INTERVENTI SU VOLTE E MURATURE, RIMOZIONE OPERE MESSA IN SICUREZZA		329'132,10	49,090	29 gg	311 gg	195	283
* * RIMOZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA.		2'865,11	0,427	214 gg	220 gg	5	7
* * CERNITA E ACCATASTAMENTO DEI CALCINACCI RIUTILIZZABILI.		957,40	0,143	29 gg	30 gg	2	2
* * RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA.		85,08	0,013	218 gg	218 gg	1	1
* * SVUOTAMENTO RINFIANCHI DELLE VOLTE.		1'148,04	0,171	218 gg	220 gg	3	3
* * SCARNITURA DELLE CONNESSURE.		3'581,21	0,534	61 gg	226 gg	8	12
	** periodo 01	2'213,28	0,330	61 gg	65 gg	3	5
	** periodo 02	1'367,93	0,204	220 gg	226 gg	5	7
* * STUCCATURE DEI GIUNTI DI MURATURA - IN MATTONI.		6'209,45	0,926	67 gg	228 gg	8	11
	** periodo 01	3'837,60	0,572	67 gg	73 gg	4	7
	** periodo 02	2'371,85	0,354	225 gg	228 gg	4	4
* * CONSOLIDAMENTO INTONACO CON MISCELA LEGANTE LEGGERA.		40'948,14	6,107	37 gg	60 gg	18	24
* * SPICCONATURA INTONACO.		844,60	0,126	74 gg	235 gg	7	9
	** periodo 01	545,38	0,081	74 gg	79 gg	4	6
	** periodo 02	299,22	0,045	233 gg	235 gg	3	3
* * RIPARAZIONE LESIONI CON CUNEI DI TEFLON.		12'915,42	1,926	80 gg	242 gg	12	21
	** periodo 01	8'339,80	1,244	80 gg	93 gg	7	14
	** periodo 02	4'575,62	0,682	236 gg	242 gg	5	7
* * RIPARAZIONE MURATURE CON SISTEMA SCUCI-CUCI - MURATURA LATERIZIO A PIU' TESTE - MURATURE FACCIAVISTA.		42'400,57	6,324	89 gg	256 gg	18	27
	** periodo 01	19'081,38	2,846	89 gg	101 gg	8	13
	** periodo 02	23'319,19	3,478	243 gg	256 gg	10	14
* * INTONACO CIVILE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3,5 E HL 5 - APPLICATO A MANO.		6'971,75	1,040	102 gg	262 gg	7	11
	** periodo 01	2'805,05	0,418	102 gg	106 gg	3	5
	** periodo 02	4'166,69	0,621	257 gg	262 gg	4	6
* * RESTAURO PITTORICO SOFFITTI VOLTE A NEUTRO O PER ANALOGIA - CASO DIFFICILE.		11'058,67	1,649	110 gg	281 gg	15	21
	** periodo 01	5'308,39	0,792	110 gg	117 gg	6	8
	** periodo 02	5'750,28	0,858	269 gg	281 gg	9	13

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * FONDO FISSANTE A BASE DI SILICATI DI POTASSIO.	492,51	0,073	282 gg	282 gg	1	1
* * TINTEGGIATURA A CALCE - PRIMA MANO A PENNELLO.	53,25	0,008	284 gg	284 gg	1	1
* * TINTEGGIATURA A CALCE - MANI SUCCESSIVE ALLA PRIMA A PENNELLO.	72,12	0,011	285 gg	285 gg	1	1
* * TINTEGGIATURA A CALCE PER ESTERNI - PRIMA MANO A PENNELLO.	137,63	0,021	284 gg	284 gg	1	1
* * TINTEGGIATURA A CALCE PER ESTERNI - MANI SUCCESSIVE ALLA PRIMA A PENNELLO.	184,74	0,028	285 gg	285 gg	1	1
* * OPERAZIONE DI RIADESIONE DI PARTI DI CORNICI DI STUCCO CADUTE.	8'820,00	1,315	120 gg	124 gg	5	5
* * RIPARAZIONE DI SOFFITTI DI INCANNUCCIATO.	571,46	0,085	127 gg	128 gg	2	2
* * RIPRISTINO CORO LIGNEO.	4'788,00	0,714	129 gg	131 gg	3	3
* * VETRO STAMPATO E TEMPERATO INCOLORE SP. 8mm.	96,89	0,014	131 gg	131 gg	1	1
* * SOVRAPPREZZO ALLE LASTRE DI VETRO PER LA SMERIGLIATURA UNIFORME.	8,58	0,001	131 gg	131 gg	1	1
* * PREPARAZIONE DEL SUPPORTO PER POSA DI MATERIALI COMPOSITI SU STRUTTURA IN MURATURA CON MALTA STRUTTURALE.	35'175,57	5,246	234 gg	261 gg	20	28
* * ASPORTAZIONE FIBRE GIA' PRESENTI POSATE IN OCCASIONE DI LAVORI PRECEDENTI.	4'037,60	0,602	260 gg	267 gg	6	8
* * RINFORZO STRUTTURALE VOLTE CON FRCM - RETE IN FIBRA PBO BIDIREZIONALE IN MATRICE INORGANICA ECOCOMPATIBILE.	114'923,80	17,141	274 gg	306 gg	25	33
* * RINFORZO STRUTTURALE VOLTE CON FRCM - CONNESSIONI CON FIBRE PBO E MATRICE INORGANICA ECOCOMPATIBILE.	21'920,00	3,269	268 gg	277 gg	8	10
* * RINFIANCO VOLTE IN MURATURA CON SABBIA ESSICCATA.	7'864,51	1,173	309 gg	311 gg	3	3
* INTERVENTO TETTO, CATENE E CAMPANILE	161'879,32	24,144	316 gg	435 gg	84	120
* * RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA.	4'467,34	0,666	316 gg	324 gg	6	9
* * SMONTAGGIO GROSSA ORDITURA LIGNEA DEL TETTO - STRUTTURE SEMPLICI (ARCARECCI, TERZERE...).	668,51	0,100	325 gg	325 gg	1	1
* * SMONTAGGIO GROSSA ORDITURA LIGNEA DEL TETTO - STRUTTURE COMPLESSE (CAPRIATE...).	1'498,56	0,224	326 gg	327 gg	2	2
* * TIRO IN ALTO/CALO IN BASSO DI MATERIALI CON ELEVATORE MECCANICO.	1'707,16	0,255	317 gg	327 gg	8	11
* * TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALE DI RISULTA.	1'946,58	0,290	325 gg	326 gg	2	2
* * CONSOLIDAMENTO PIANO DI APPOGGIO ORDITURA DEI SOLAI - GROSSA ORDITURA E CAPRIATE.	1'294,05	0,193	327 gg	330 gg	2	4
* * CONSOLIDAMENTO PIANO DI APPOGGIO ORDITURA DEI SOLAI - MEDIA E PICCOLA ORDITURA.	5'799,78	0,865	331 gg	332 gg	2	2
* * GROSSA ORDITURA IN LEGNO DI CASTAGNO - STRUTTURA COMPOSTA (CAPRIATE, PUNTONI).	3'000,16	0,447	332 gg	333 gg	2	2
* * GROSSA ORDITURA IN LEGNO DI CASTAGNO - STRUTTURA SEMPLICE (ARCARECCI E TERZERE).	4'397,78	0,656	333 gg	337 gg	3	5
* * PICCOLA ORDITURA IN LEGNO DI ABETE.	4'037,95	0,602	365 gg	368 gg	4	4
* * RIMONTAGGIO PICCOLA ORDITURA LIGNEA RIMOSSA, INTEGRAZIONE CON MATERIALE NUOVO FINO AL 25% .	538,85	0,080	369 gg	369 gg	1	1
* * TAVOLATO IN LEGNO DI ABETE SP. 2,5/3cm.	7'279,11	1,086	372 gg	379 gg	6	8
* * RIMONTAGGIO PIANELLE PROVENIENTI DALLA RIMOZIONE.	4'196,58	0,626	380 gg	387 gg	6	8

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * PIANELLATO IN LATERIZIO - PIANELLE TIPO A MANO 12 X 12 X 2,5cm.	2'948,94	0,440	382 gg	386 gg	3	5
* * PRIMER BITUMINOSO ALL'ACQUA.	190,60	0,028	383 gg	383 gg	1	1
* * DOPPIA GUAINA BITUMINOSA ADESIVA DI CUI QUELLA SUPERIORE ARDESIATA.	2'362,14	0,352	386 gg	389 gg	4	4
* * MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE IN LATERIZIO - CANALE E COPPO.	2'473,46	0,369	389 gg	390 gg	2	2
* * SOVRAPPREZZO PER IL FISSAGGIO MECCANICO CON GANCI IN LAMIERA D RAME.	6'172,90	0,921	389 gg	390 gg	2	2
* * RIMONTAGGIO E RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA IN COPPI DOPPI, INTEGRAZIONE CON MATERIALE NUOVO FINO AL 30%.	10'276,50	1,533	400 gg	415 gg	12	16
* * GRIGLIA PARAPASSERO IN ACCIAIO PREVERNICIATO.	1'233,17	0,184	386 gg	386 gg	1	1
* * PETTINE PARAPASSERI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO.	97,20	0,014	386 gg	386 gg	1	1
* * CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE IN LAMIERA DI RAME SPESSORE 6/10mm SVILUPPO 50cm.	6'633,90	0,989	393 gg	394 gg	2	2
* * CICOGNE PER SOSTEGNO CANALE DI GRONDA IN RAME.	876,90	0,131	393 gg	393 gg	1	1
* * PLUVIALI IN LAMIERA DI RAME SPESSORE 6/1mm DIAMETRO 100mm.	1'243,38	0,185	395 gg	395 gg	1	1
* * COLLARI PER IL SOSTEGNO DEI PLUVIALI IN RAME.	174,42	0,026	395 gg	395 gg	1	1
* * COLMO VENTILATO.	1'026,90	0,153	397 gg	397 gg	1	1
* * PERFORAZIONE PICCOLO DIAMETRO.	2'005,13	0,299	386 gg	386 gg	1	1
* * PERFORAZIONE A ROTAZIONE CON ATTREZZATURA DIAMANTATA Ø35mm LUNGHEZZA FINO A 15m.	4'711,68	0,703	387 gg	388 gg	2	2
* * CATENE IN ACCIAIO.	30'738,80	4,585	389 gg	395 gg	5	7
* * PALETTO CAPOCHIAVE.	13'392,18	1,997	389 gg	395 gg	5	7
* * ZINCATURA PRODOTTI IN ACCIAIO UNI EN ISO 1461.	1'330,68	0,198	389 gg	395 gg	5	7
* * VERNICIATURE OPERE METALLICHE CON SMALTO OPACO - DUE MANI DATE A PENNELLO.	1'327,26	0,198	389 gg	395 gg	5	7
* * FORMAZIONE DI NICCHIE PER POSA MASCHERATA DI PIASTRE METALLICHE.	363,03	0,054	397 gg	397 gg	1	1
* * PIASTRE METALLICHE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI.	471,75	0,070	397 gg	397 gg	1	1
* * INTONACO CIVILE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3,5 E HL 5 - APPLICATO A MANO.	30,67	0,005	400 gg	400 gg	1	1
* * INIEZIONE PER SIGILLATURA CUCITURA ARMATA DI MALTA A PRESSIONE.	1'907,73	0,285	401 gg	401 gg	1	1
* * SOSTITUZIONE DI ARCHITRAVI PER PORTE E FINESTRE - IN TRAVI DI LEGNO.	1'938,51	0,289	401 gg	404 gg	4	4
* * SOSTITUZIONE DI ARCHITRAVI PER PORTE E FINESTRE - IN TRAVI PREFABBRICATE IN C.A. - MURI CON SPESSORE DA 15 A 30cm.	445,44	0,066	407 gg	407 gg	1	1
* * CARPENTERIA METALLICA PER TRAVATURE COMPOSTE.	11'973,37	1,786	338 gg	383 gg	34	46
* * TASSELLO/BARRA FILETTATA.	11'476,08	1,712	424 gg	435 gg	8	12
* * RESTAURO E RISANAMENTO PINNACOLI.	3'224,19	0,481	424 gg	429 gg	4	6

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	37'542,22	5,599	430 gg	528 gg	68	99
* * DEMOLIZIONE SELCIATO IN LASTRE DI PIETRA.	590,52	0,088	430 gg	430 gg	1	1
* * RIMOZIONE CIGLI STRADALI IN PORFIDO.	23,91	0,004	430 gg	430 gg	1	1
* * DEMOLIZIONE CALCESTRUZZO ARMATO CON MARTELLO DEMOLITORE.	1'213,44	0,181	431 gg	431 gg	1	1
* * SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE SCIOLTE.	19,79	0,003	431 gg	431 gg	1	1
* * COMPENSO ALLO SCAVO IN PRESENZA DI TERRE ARGILLOSE.	68,64	0,010	431 gg	431 gg	1	1
* * TRASPORTO A RIFIUTO MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI - FINO A 10km.	27,55	0,004	431 gg	431 gg	1	1
* * SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA PER POSA TUBAZIONI.	53,04	0,008	432 gg	432 gg	1	1
* * CANALETTA DI DRENAGGIO 100X20X18cm CON GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO.	459,44	0,069	435 gg	435 gg	1	1
* * COPERTURA PER CANALETTA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON FESSURA LATERALE ALTEZZA 60mm.	1'670,64	0,249	436 gg	436 gg	1	1
* * POZZETTO IN CLS VIBRATO DIMENSIONI ESTERNE 50X50cm.	395,24	0,059	437 gg	437 gg	1	1
* * ELEMENTO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN CLS VIBRATO DIMENSIONI ESTERNE 50X50cm.	132,27	0,020	437 gg	437 gg	1	1
* * CHIUSINO A SCOMPARSA PER POZZETTI 40X40cm INTERNI IN ACCIAIO ZINCATO.	274,16	0,041	438 gg	438 gg	1	1
* * CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTO IN CLS VIBRATO DIM TELAIO 50X50cm APERTURA 40X40cm.	342,33	0,051	439 gg	439 gg	1	1
* * SOTTOFONDO PER TUBAZIONI IN LETTO DI SABBIA SP. 15cm.	54,60	0,008	442 gg	442 gg	1	1
* * TUBO IN PVC Ø125 SDR 41 (SN 4 kN/m²).	59,24	0,009	443 gg	445 gg	3	3
* * TUBO IN PVC Ø160 SDR 41 (SN 4 kN/m²).	301,58	0,045	443 gg	445 gg	3	3
* * RINFIANCO TUBAZIONI CON MAGRONE DI CLS.	311,13	0,046	446 gg	446 gg	1	1
* * REINTERRO FOSSA APERTA PER POSA TUBI CON MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO.	3,02	0,000	449 gg	449 gg	1	1
* * REINTERRO CON FORNITURA DI MATERIALE.	45,78	0,007	449 gg	449 gg	1	1
* * CIGLI PER MARCIAPIEDI IN PORFIDO UGUALE A QUELLI ESISTENTI SEZIONE 12 x 25cm.	320,99	0,048	452 gg	452 gg	1	1
* * CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO PER OPERE DI FONDAZIONE C25/30 (Rck 30 N/mmq)	627,67	0,094	453 gg	453 gg	1	1
* * RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO TIPO B450C DIAMETRO10 mm.	385,03	0,057	453 gg	453 gg	1	1
* * PAVIMENTAZIONE IN FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO UGUALI ALL'ESISTENTE.	2'090,76	0,312	456 gg	460 gg	4	5
* * IMPATTO SU LINEA ACQUE BIANCHE ESISTENTE.	699,84	0,104	449 gg	449 gg	1	1
* * RIMOZIONE BUSOLA D'INGRESSO.	1'601,51	0,239	463 gg	466 gg	4	4
* * SMONTAGGIO OPERE IN PIETRA A MASSELLO DI PARTI STRUTTURALI OD ARCHITETTONICHE SEMPLICI.	255,73	0,038	467 gg	467 gg	1	1
* * DEMOLIZIONE MURATURA IN MATTONI.	81,50	0,012	467 gg	467 gg	1	1
* * MASSETTO DI SOTTOFONDO SPESSORE MEDIO 4cm.	85,37	0,013	467 gg	467 gg	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * RICOLLOCAMENTO SOGLIA IN PIETRA.	116,27	0,017	467 gg	467 gg	1	1
* * PROFILATI IN FERRO PER RAMPA INGRESSO.	1'990,95	0,297	467 gg	472 gg	4	6
* * ZINCATURA PRODOTTI IN ACCIAIO UNI EN ISO 1461.	137,54	0,021	467 gg	472 gg	4	6
* * MODIFICA AL PORTONE DI INGRESSO.	3'149,50	0,470	474 gg	480 gg	5	7
* * LASTRE IN PIETRA SP. 3cm PER PAVIMENTAZIONE NUOVA RAMPA IN MARMO TIPO ROSSO DI VERONA.	528,75	0,079	473 gg	473 gg	1	1
* * DEMOLIZIONE RIVESTIMENTO IN CERAMICA.	38,64	0,006	481 gg	481 gg	1	1
* * SPICCONATURA INTONACO.	142,98	0,021	481 gg	481 gg	1	1
* * DEMOLIZIONE PAVIMENTO IN PIASTRELLE.	73,99	0,011	484 gg	484 gg	1	1
* * DEMOLIZIONE MASSETTO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO.	136,18	0,020	484 gg	484 gg	1	1
* * RIMOZIONE LAVABO.	39,90	0,006	485 gg	485 gg	1	1
* * RIMOZIONE SCALDABAGNO.	56,20	0,008	485 gg	485 gg	1	1
* * RIMOZIONE TUBAZIONE IMPIANTO IDRICO.	31,50	0,005	486 gg	486 gg	1	1
* * RIMOZIONE RUBINETTERIE E APPARECCHI DI INTERCETTAZIONE VARI.	57,50	0,009	487 gg	487 gg	1	1
* * RIMOZIONE TUBO DI SCARICO.	19,70	0,003	488 gg	488 gg	1	1
* * APERTURA DI VANO IN PARETE DI MATTONI.	129,27	0,019	491 gg	491 gg	1	1
* * MURATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO CON BLOCCHI 12x25x25cm, peso 6,61/cad.	247,68	0,037	492 gg	492 gg	1	1
* * ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI CON SEZIONE 101÷150cm².	1'423,44	0,212	493 gg	495 gg	3	3
* * COLONNA DI SCARICO PVC FONOASSORBENTE Ø110.	1'240,86	0,185	498 gg	498 gg	1	1
* * RETE DI SCARICO PER SERVIZIO IGIENICO.	715,70	0,107	499 gg	499 gg	1	1
* * RETE GENERALE DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E FREDDA PER SERVIZIO IGIENICO.	1'022,36	0,152	500 gg	500 gg	1	1
* * TUBO IN PVC Ø50mm, SDR 21 (PN 10).	67,08	0,010	499 gg	499 gg	1	1
* * TUBO IN PEHD Ø25mm.	97,90	0,015	499 gg	499 gg	1	1
* * MANICOTTO PER SALDATURA TUBI IN PEHD Ø25mm.	89,40	0,013	500 gg	500 gg	1	1
* * MASSETTO ISOLANTE CON PERLITE ESPANSA.	207,25	0,031	501 gg	501 gg	1	1
* * MASSETTO DI SOTTOFONDO SPESSORE MEDIO 4cm.	168,46	0,025	502 gg	502 gg	1	1
* * CAROTAGGIO PARETE DIAMETRO FORO 110/150mm.	270,55	0,040	505 gg	505 gg	1	1
* * INTONACO CIVILE A BASE DI CALCE NATURALE NHL 3,5 E HL 5 - APPLICATO A MANO.	221,62	0,033	507 gg	507 gg	1	1
* * CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SP 2,5cm PER MURI CON SPESSORE 15cm.	141,70	0,021	506 gg	506 gg	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO 30X30cm SPESSORE 8mm TINTA UNITA.	523,47	0,078	508 gg	508 gg	1	1
* * RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO 30X30cm FINITURA NATURALE.	2'015,93	0,301	509 gg	513 gg	3	5
* * SCALDAACQUA ELETTRICO 80l.	244,11	0,036	514 gg	514 gg	1	1
* * CASSETTA DI RISCIAQUO A ZAINO IN PLASTICA.	204,98	0,031	515 gg	515 gg	1	1
* * VASO IGENICO.	948,98	0,142	515 gg	515 gg	1	1
* * LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA DIMENSIONI 70x55cm.	748,18	0,112	516 gg	516 gg	1	1
* * SOVRAPPREZZO AL LAVABO PER FORNITURA E POSA DI COLONNA IN PORCELLANA VETRIFICATA.	163,86	0,024	516 gg	516 gg	1	1
* * BIDET.	636,84	0,095	519 gg	519 gg	1	1
* * MANIGLIONE ORIZZONTALE PER DISABILI LUNGHEZZA 555mm	141,64	0,021	519 gg	519 gg	1	1
* * MANIGLIONE ORIZZONTALE PER DISABILI LUNGHEZZA 835 mm	155,14	0,023	519 gg	519 gg	1	1
* * MANIGLIONE VERTICALE PER DISABILI H 162cm.	278,86	0,042	520 gg	520 gg	1	1
* * MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO.	281,58	0,042	520 gg	520 gg	1	1
* * REALIZZAIONE IMPIANTO ELETTRICO DEI SERVIZI IGIENICI PER DISABILI AL PIANO TERRA.	5'400,00	0,805	521 gg	526 gg	4	6
* * TINTEGGIATURA A CALCE - PRIMA MANO A PENNELLO.	36,69	0,005	527 gg	527 gg	1	1
* * TINTEGGIATURA A CALCE - MANI SUCCESSIVE ALLA PRIMA A PENNELLO.	49,69	0,007	527 gg	527 gg	1	1
* * PORTA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA 210X60-90cm ANTA CIECA LISCIA LACCATA COLORATA.	954,68	0,142	528 gg	528 gg	1	1

Carpi, 20/04/2018

Tecnico
per lo Studio Sulla Via della Pace

Carpi

Parrocchia della Conversione di San Paolo Apostolo in Budrione di Carpi

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Ripristino dell'agibilità della Chiesa e della Canonica della parrocchia della Conversione di S. Paolo Apostolo in Budrione di Carpi

COMMITTENTE: Diocesi di Carpi

Carpi, 20/04/2018

Il Tecnico
(per lo Studio Sulla Via della Pace)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	5,41	5,41	0,001
2 gg	15,24	20,65	0,003
3 gg	12,66	33,31	0,005
4 gg	2,82	36,13	0,005
5 gg	75,68	111,81	0,017
8 gg	79,68	191,48	0,029
9 gg	79,68	271,16	0,040
10 gg	6,82	277,98	0,041
11 gg	6,82	284,80	0,042
12 gg	6,82	291,61	0,043
15 gg	6,82	298,43	0,045
16 gg	6,82	305,25	0,046
17 gg	6,82	312,07	0,047
18 gg	6,82	318,89	0,048
19 gg	6,82	325,71	0,049
22 gg	56,88	382,58	0,057
23 gg	56,88	439,46	0,066
24 gg	56,88	496,33	0,074
25 gg	56,88	553,21	0,083
26 gg	56,88	610,08	0,091
29 gg	535,58	1'145,66	0,171
30 gg	535,58	1'681,24	0,251
32 gg	579,41	2'260,65	0,337
33 gg	667,85	2'928,50	0,437
36 gg	1'052,86	3'981,36	0,594
37 gg	3'327,76	7'309,12	1,090
38 gg	3'327,76	10'636,88	1,586
39 gg	3'058,76	13'695,64	2,043
40 gg	3'058,76	16'754,40	2,499
43 gg	5'823,42	22'577,82	3,367
44 gg	5'823,42	28'401,24	4,236
45 gg	5'823,42	34'224,66	5,105
46 gg	5'823,42	40'048,08	5,973
47 gg	5'823,42	45'871,50	6,842
50 gg	5'823,42	51'694,92	7,710
51 gg	5'823,42	57'518,33	8,579
52 gg	3'070,91	60'589,24	9,037
53 gg	3'070,91	63'660,14	9,495
54 gg	3'070,91	66'731,05	9,953
57 gg	3'070,91	69'801,96	10,411
58 gg	3'070,91	72'872,86	10,869
59 gg	3'070,91	75'943,77	11,327
60 gg	3'070,91	79'014,68	11,785
61 gg	946,96	79'961,64	11,926
64 gg	946,96	80'908,60	12,067
65 gg	946,96	81'855,56	12,209
66 gg	209,20	82'064,76	12,240
67 gg	1'168,60	83'233,36	12,414
71 gg	1'168,60	84'401,96	12,589
72 gg	1'168,60	85'570,56	12,763
73 gg	1'168,60	86'739,16	12,937
74 gg	345,55	87'084,70	12,989
75 gg	345,55	87'430,25	13,040
78 gg	345,55	87'775,79	13,092
79 gg	345,55	88'121,34	13,143
80 gg	1'400,60	89'521,94	13,352

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
81 gg	1'400,60	90'922,54	13,561
82 gg	1'400,60	92'323,14	13,770
87 gg	1'400,60	93'723,74	13,979
88 gg	1'400,60	95'124,34	14,188
89 gg	3'785,77	98'910,11	14,752
93 gg	3'785,77	102'695,89	15,317
94 gg	2'594,37	105'290,26	15,704
95 gg	2'594,37	107'884,63	16,091
96 gg	2'594,37	110'479,00	16,478
99 gg	2'594,37	113'073,38	16,865
100 gg	2'594,37	115'667,75	17,252
101 gg	2'594,37	118'262,12	17,639
102 gg	1'144,22	119'406,34	17,809
103 gg	1'144,22	120'550,56	17,980
106 gg	1'144,22	121'694,78	18,151
107 gg	209,20	121'903,98	18,182
108 gg	209,20	122'113,18	18,213
109 gg	209,20	122'322,38	18,244
110 gg	1'093,93	123'416,31	18,407
113 gg	1'093,93	124'510,24	18,571
114 gg	1'093,93	125'604,17	18,734
115 gg	1'093,93	126'698,11	18,897
116 gg	1'093,93	127'792,04	19,060
117 gg	1'093,93	128'885,97	19,223
120 gg	1'973,20	130'859,17	19,518
121 gg	1'973,20	132'832,37	19,812
122 gg	1'973,20	134'805,57	20,106
123 gg	1'983,13	136'788,70	20,402
124 gg	1'983,13	138'771,83	20,698
127 gg	504,86	139'276,69	20,773
128 gg	504,86	139'781,55	20,848
129 gg	1'815,13	141'596,68	21,119
130 gg	1'815,13	143'411,81	21,390
131 gg	1'920,60	145'332,41	21,676
134 gg	219,13	145'551,54	21,709
135 gg	219,13	145'770,67	21,742
136 gg	219,13	145'989,80	21,774
137 gg	219,13	146'208,93	21,807
138 gg	219,13	146'428,06	21,840
141 gg	219,13	146'647,19	21,872
142 gg	219,13	146'866,32	21,905
143 gg	219,13	147'085,45	21,938
144 gg	219,13	147'304,58	21,970
145 gg	219,13	147'523,71	22,003
148 gg	219,13	147'742,84	22,036
149 gg	219,13	147'961,97	22,068
150 gg	219,13	148'181,10	22,101
151 gg	296,54	148'477,64	22,145
152 gg	296,54	148'774,18	22,190
155 gg	296,54	149'070,72	22,234
156 gg	296,54	149'367,26	22,278
157 gg	296,54	149'663,80	22,322
158 gg	296,54	149'960,34	22,367
159 gg	296,54	150'256,88	22,411
162 gg	207,91	150'464,79	22,442
163 gg	207,91	150'672,70	22,473

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
164 gg	207,91	150'880,61	22,504
165 gg	207,91	151'088,52	22,535
166 gg	207,91	151'296,43	22,566
169 gg	207,91	151'504,34	22,597
170 gg	207,91	151'712,25	22,628
171 gg	207,91	151'920,16	22,659
172 gg	207,91	152'128,07	22,690
173 gg	207,91	152'335,98	22,721
176 gg	207,91	152'543,89	22,752
177 gg	207,91	152'751,80	22,783
178 gg	207,91	152'959,71	22,814
179 gg	207,91	153'167,62	22,845
180 gg	207,91	153'375,53	22,876
184 gg	207,91	153'583,44	22,907
185 gg	207,91	153'791,35	22,938
186 gg	207,91	153'999,26	22,969
187 gg	207,91	154'207,17	23,000
190 gg	207,91	154'415,08	23,031
191 gg	207,91	154'622,99	23,062
192 gg	207,91	154'830,90	23,093
193 gg	207,91	155'038,81	23,124
194 gg	207,91	155'246,72	23,155
197 gg	207,91	155'454,63	23,186
198 gg	207,91	155'662,54	23,217
199 gg	207,91	155'870,45	23,248
200 gg	207,91	156'078,36	23,279
201 gg	207,91	156'286,27	23,310
204 gg	207,91	156'494,18	23,341
205 gg	207,91	156'702,09	23,372
207 gg	207,91	156'910,00	23,403
208 gg	207,91	157'117,91	23,434
211 gg	1'907,91	159'025,82	23,719
213 gg	2'749,71	161'775,53	24,129
214 gg	3'322,73	165'098,26	24,624
215 gg	3'322,73	168'420,99	25,120
218 gg	3'790,49	172'211,48	25,685
219 gg	2'005,41	174'216,89	25,984
220 gg	2'278,99	176'495,88	26,324
221 gg	1'323,29	177'819,17	26,522
222 gg	1'323,29	179'142,47	26,719
225 gg	1'916,26	181'058,72	27,005
226 gg	1'916,26	182'974,98	27,291
227 gg	1'642,67	184'617,65	27,536
228 gg	1'642,67	186'260,32	27,781
229 gg	1'049,71	187'310,03	27,937
232 gg	1'049,71	188'359,73	28,094
233 gg	1'149,45	189'509,18	28,265
234 gg	2'908,23	192'417,41	28,699
235 gg	2'908,23	195'325,64	29,133
236 gg	3'723,61	199'049,25	29,688
239 gg	3'723,61	202'772,86	30,243
240 gg	3'723,61	206'496,47	30,799
241 gg	3'723,61	210'220,08	31,354
242 gg	3'723,61	213'943,68	31,910
243 gg	5'140,41	219'084,09	32,676
246 gg	4'298,61	223'382,70	33,317

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
247 gg	4'298,61	227'681,30	33,959
248 gg	4'298,61	231'979,91	34,600
249 gg	4'298,61	236'278,52	35,241
250 gg	4'298,61	240'577,13	35,882
253 gg	4'298,61	244'875,73	36,523
254 gg	4'298,61	249'174,34	37,164
255 gg	4'298,61	253'472,95	37,805
256 gg	4'298,61	257'771,56	38,447
257 gg	3'008,36	260'779,92	38,895
260 gg	3'681,29	264'461,22	39,444
261 gg	3'681,30	268'142,51	39,993
262 gg	1'922,51	270'065,03	40,280
263 gg	880,84	270'945,87	40,411
264 gg	880,84	271'826,71	40,543
267 gg	880,84	272'707,55	40,674
268 gg	2'947,91	275'655,46	41,114
269 gg	3'586,83	279'242,29	41,649
270 gg	3'586,83	282'829,12	42,184
271 gg	3'586,83	286'415,95	42,719
274 gg	8'173,85	294'589,80	43,938
275 gg	8'173,85	302'763,66	45,157
276 gg	8'173,85	310'937,51	46,376
277 gg	8'173,85	319'111,36	47,595
278 gg	5'433,85	324'545,21	48,406
281 gg	5'433,85	329'979,07	49,216
282 gg	5'287,44	335'266,51	50,005
283 gg	4'794,93	340'061,44	50,720
284 gg	4'985,81	345'047,25	51,464
285 gg	5'051,79	350'099,05	52,217
288 gg	4'794,93	354'893,98	52,932
289 gg	4'794,93	359'688,91	53,647
290 gg	4'794,93	364'483,84	54,363
291 gg	4'794,93	369'278,78	55,078
292 gg	4'794,93	374'073,71	55,793
295 gg	4'794,93	378'868,64	56,508
296 gg	4'794,93	383'663,57	57,223
297 gg	4'794,93	388'458,51	57,938
298 gg	4'794,93	393'253,44	58,654
299 gg	4'794,93	398'048,37	59,369
302 gg	4'794,93	402'843,30	60,084
303 gg	4'794,93	407'638,24	60,799
304 gg	4'794,93	412'433,17	61,514
305 gg	4'794,93	417'228,10	62,229
306 gg	4'794,93	422'023,03	62,945
309 gg	2'819,48	424'842,51	63,365
310 gg	2'819,48	427'662,00	63,786
311 gg	2'819,48	430'481,48	64,206
312 gg	197,98	430'679,46	64,236
313 gg	197,98	430'877,44	64,265
316 gg	942,54	431'819,98	64,406
317 gg	1'155,93	432'975,91	64,578
319 gg	1'155,93	434'131,84	64,751
320 gg	1'155,93	435'287,77	64,923
323 gg	1'155,93	436'443,70	65,095
324 gg	1'155,94	437'599,64	65,268
325 gg	2'053,18	439'652,81	65,574

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
326 gg	2'133,94	441'786,76	65,892
327 gg	1'807,69	443'594,44	66,162
330 gg	845,01	444'439,45	66,288
331 gg	3'097,87	447'537,33	66,750
332 gg	4'597,95	452'135,28	67,436
333 gg	3'163,99	455'299,26	67,908
334 gg	1'663,91	456'963,17	68,156
337 gg	2'171,60	459'134,77	68,480
338 gg	1'057,83	460'192,60	68,638
339 gg	1'057,83	461'250,43	68,795
340 gg	776,68	462'027,11	68,911
341 gg	776,68	462'803,79	69,027
344 gg	776,68	463'580,47	69,143
345 gg	776,68	464'357,15	69,259
346 gg	776,68	465'133,83	69,375
347 gg	776,68	465'910,51	69,490
348 gg	537,99	466'448,51	69,571
351 gg	537,99	466'986,50	69,651
352 gg	537,99	467'524,49	69,731
353 gg	537,99	468'062,48	69,811
354 gg	537,99	468'600,47	69,892
355 gg	537,99	469'138,47	69,972
358 gg	537,99	469'676,46	70,052
359 gg	537,99	470'214,45	70,132
360 gg	537,99	470'752,44	70,213
361 gg	537,99	471'290,43	70,293
362 gg	537,99	471'828,43	70,373
365 gg	1'547,49	473'375,91	70,604
366 gg	1'528,25	474'904,16	70,832
367 gg	1'528,25	476'432,41	71,060
368 gg	1'528,25	477'960,65	71,288
369 gg	1'057,61	479'018,26	71,445
372 gg	1'731,94	480'750,21	71,704
373 gg	1'731,94	482'482,15	71,962
374 gg	1'731,94	484'214,09	72,220
375 gg	1'731,94	485'946,04	72,479
376 gg	1'731,94	487'677,98	72,737
379 gg	1'731,95	489'409,93	72,995
380 gg	1'218,19	490'628,12	73,177
381 gg	1'218,19	491'846,31	73,359
382 gg	2'201,17	494'047,47	73,687
383 gg	2'391,77	496'439,24	74,044
386 gg	5'775,05	502'214,29	74,905
387 gg	3'812,41	506'026,70	75,474
388 gg	3'112,98	509'139,67	75,938
389 gg	14'438,11	523'577,78	78,091
390 gg	13'847,57	537'425,34	80,157
393 gg	13'718,24	551'143,58	82,203
394 gg	12'841,34	563'984,91	84,118
395 gg	10'942,19	574'927,10	85,750
397 gg	2'028,28	576'955,38	86,053
400 gg	1'053,65	578'009,03	86,210
401 gg	3'415,33	581'424,36	86,719
402 gg	1'507,60	582'931,97	86,944
403 gg	1'507,60	584'439,57	87,169
404 gg	1'507,61	585'947,18	87,394

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
407 gg	1'468,42	587'415,59	87,613
408 gg	1'022,98	588'438,57	87,765
409 gg	1'022,98	589'461,55	87,918
410 gg	1'022,98	590'484,52	88,071
411 gg	1'022,98	591'507,50	88,223
414 gg	1'022,98	592'530,47	88,376
415 gg	1'022,98	593'553,45	88,528
416 gg	166,60	593'720,05	88,553
417 gg	166,60	593'886,66	88,578
418 gg	166,60	594'053,26	88,603
421 gg	166,60	594'219,86	88,628
422 gg	166,60	594'386,46	88,652
423 gg	166,60	594'553,06	88,677
424 gg	2'407,16	596'960,22	89,036
425 gg	2'407,16	599'367,37	89,395
428 gg	2'407,16	601'774,53	89,754
429 gg	2'407,16	604'181,69	90,113
430 gg	2'215,54	606'397,23	90,444
431 gg	2'930,53	609'327,76	90,881
432 gg	1'654,15	610'981,91	91,128
435 gg	2'060,55	613'042,46	91,435
436 gg	1'837,24	614'879,71	91,709
437 gg	694,11	615'573,82	91,813
438 gg	440,76	616'014,58	91,878
439 gg	508,93	616'523,51	91,954
442 gg	221,20	616'744,71	91,987
443 gg	286,87	617'031,58	92,030
444 gg	286,87	617'318,46	92,073
445 gg	286,88	617'605,34	92,116
446 gg	477,73	618'083,07	92,187
449 gg	915,24	618'998,31	92,323
452 gg	487,59	619'485,90	92,396
453 gg	1'179,30	620'665,20	92,572
456 gg	689,29	621'354,49	92,675
458 gg	689,29	622'043,78	92,778
459 gg	689,29	622'733,07	92,880
460 gg	689,29	623'422,36	92,983
463 gg	566,98	623'989,34	93,068
464 gg	566,98	624'556,32	93,152
465 gg	566,98	625'123,30	93,237
466 gg	566,98	625'690,28	93,321
467 gg	1'237,59	626'927,87	93,506
470 gg	698,72	627'626,59	93,610
471 gg	698,72	628'325,32	93,714
472 gg	698,73	629'024,05	93,819
473 gg	695,35	629'719,40	93,922
474 gg	796,50	630'515,90	94,041
477 gg	796,50	631'312,40	94,160
478 gg	796,50	632'108,90	94,279
479 gg	796,50	632'905,40	94,398
480 gg	796,50	633'701,90	94,516
481 gg	348,22	634'050,12	94,568
484 gg	376,77	634'426,89	94,625
485 gg	262,70	634'689,59	94,664
486 gg	198,10	634'887,69	94,693
487 gg	224,10	635'111,79	94,727

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
488 gg	186,30	635'298,10	94,754
491 gg	295,87	635'593,97	94,799
492 gg	414,28	636'008,25	94,860
493 gg	641,08	636'649,33	94,956
494 gg	641,08	637'290,41	95,052
495 gg	641,08	637'931,49	95,147
498 gg	1'407,46	639'338,95	95,357
499 gg	1'047,28	640'386,23	95,513
500 gg	1'278,36	641'664,59	95,704
501 gg	373,85	642'038,44	95,760
502 gg	335,06	642'373,50	95,810
505 gg	437,15	642'810,65	95,875
506 gg	308,30	643'118,95	95,921
507 gg	388,22	643'507,17	95,979
508 gg	690,07	644'197,24	96,082
509 gg	838,58	645'035,82	96,207
512 gg	838,58	645'874,40	96,332
513 gg	838,58	646'712,98	96,457
514 gg	410,71	647'123,69	96,518
515 gg	1'320,56	648'444,25	96,715
516 gg	1'078,64	649'522,89	96,876
519 gg	1'783,27	651'306,16	97,142
520 gg	1'410,09	652'716,25	97,352
521 gg	2'199,65	654'915,91	97,680
522 gg	2'199,65	657'115,56	98,009
523 gg	2'199,65	659'315,21	98,337
526 gg	2'199,65	661'514,87	98,665
527 gg	936,03	662'450,90	98,804
528 gg	1'804,33	664'255,23	99,073
529 gg	849,65	665'104,89	99,200
530 gg	849,65	665'954,54	99,327
533 gg	849,65	666'804,19	99,454
534 gg	849,65	667'653,84	99,580
535 gg	849,65	668'503,50	99,707
536 gg	849,65	669'353,15	99,834
537 gg	849,65	670'202,80	99,960
540 gg	6,82	670'209,62	99,961
541 gg	6,82	670'216,44	99,963
542 gg	79,68	670'296,11	99,974
543 gg	79,68	670'375,79	99,986
544 gg	92,07	670'467,86	100,000

Carpi, 20/04/2018

Tecnico
per lo Studio Sulla Via della Pace
